ACCOMPLIR + POUR

Jésus-Christ
L'Église
L'Évangile
La Communauté

Église de l'Espoir, Longueuil

PROJET 911+

Mars 2019

RÉNOVATIONS - RÉAMÉNAGEMENTS

PROJET 911+

Sommaire

3 L’historique du projet

4 L’histoire du 911 Roland-Therrien

5 Réflexions et objectifs recherchés

6 Analyse de la situation

7 Phase 1

11 Phase 2

12 Phase 3

13 Financement et budget

15 Échéancier & mot de la fin

PSAUMES 91.1

« Celui qui demeure sous l’abri du Très-Haut repose à l’ombre du Tout-Puissant »

VISION 2019 & 60e

Église de l’Espoir

Une Église émerveillée par l’Évangile de Jésus-Christ, au service de la Communauté.

En 2019, l’Église de l’Espoir renouvelle son énoncé de vision, dans le but de continuer à progresser et d’avoir une direction concrète pour les prochaines années. Cinq valeurs ont été choisies et formulées ainsi :

A Aimer - Dieu
I Inviter - notre prochain
D Desservir - la Communauté
E Envoyer - des missionnaires
R Reproduire - des disciples

Nous voulons être une Église qui fait du bien autour d’elle, qui va vers son prochain et qui cherche à plaire au Seigneur. Nous voulons AIDER. En rénovant et réaménageant le 911 boulevard Roland-Therrien, notre but est de mieux pouvoir accomplir la vision, mieux servir le Seigneur et mieux desservir les membres, ainsi que la société.

En 2019, l’assemblée fêtera son 60e anniversaire. Tout au long de ces décennies, le Seigneur n’a cessé de bénir et d’accomplir son plan divin. Nous avons foi qu’il continuera d’œvrer dans l’Église et par celle-ci, qu’il nous bénira, qu’il nous dirigera dans ses voies, et nous savons qu’il sera fidèle envers nous, comme il l’a été ces 60 dernières années.

L’HISTORIQUE DU PROJET

Janvier 2015 **Comité Plan B**

Les débuts du Projet 911+ remontent à janvier 2015, alors que le conseil des Anciens met sur pied le comité Plan B (B pour bâtiment). Celui-ci est constitué de quelques membres de l’assemblée et de 3 chrétiens de l’extérieur, 1 entrepreneur et 2 architectes. Le mandat qui leur est confié est de répondre à la question suivante : sommes-nous au bon endroit, avec le bon bâtiment, pour accomplir la vision de l’Église de l’Espoir ?

Un document de 34 pages est produit, dans lequel l’équipe analyse la situation, réfléchit et fait certaines recommandations.

Conclusion : Oui, nous sommes au bon endroit ! Cependant, pour accomplir la vision, l’Église doit investir pour améliorer significativement le bâtiment actuel qui possède tout un potentiel.

Octobre 2016 **Comité Priorités**

Un deuxième comité voit le jour pour continuer la réflexion. Son mandat : identifier les rénovations et investissements nécessaires pour soutenir la vision et la croissance.

Une liste d’environ 50 priorités est établie selon 3 critères : pratique, confort et esthétique. Après évaluation, les membres du comité recommandent de rénover en priorité les sanitaires, le vestiaire et la grande salle afin d’améliorer significativement le bâtiment.

Les autres éléments à améliorer feront partie, Dieu voulant, des prochains développements.

Avril 2017 **Comité Design**

Une fois les priorités identifiées, un dernier comité, constitué de Yanick Ethier, Maxime Giroux, Bruno Goineau, Oscar Hernandez et Denis Latour, est créé. Il a pour tâche de sélectionner une firme d’architecte/designer qui développera un plan d’aménagement basé sur lesdites priorités.

Des recherches s’effectuent et la firme Giasson Farregut est embauchée en septembre 2017. Les plans sont complétés et livrés en 2018. Ceux-ci reçoivent l’appui du conseil des Anciens.

L'HISTOIRE DU 911 ROLAND-THERRIEN

Analyse de la situation

Afin d'aider à la compréhension du Projet 911+, une analyse de la situation de l'Église a été effectuée. De nombreuses heures de discussions, de réflexions, d'échanges et de recherches furent nécessaires. Le comité Design a cherché la face du Seigneur à chaque nouvelle étape du Projet 911+. Leurs conclusions quant à l'avenir du bâtiment firent consensus.

L'histoire du 911 Roland-Therrien

Le 911 boulevard Roland-Therrien est âgé de bientôt 60 ans. La construction de la section ouest du bâtiment (coiffeur, dépanneur, logements) date des années 60. La section est (administration, école du dimanche) apparaît une décennie plus tard, durant les années 70. C'est en 1980 que les deux entités sont réunies en un lieu commun pour devenir un centre commercial .

Le tout est partiellement rénové en 1995 et en 2001. En 2005, l'Église de l'Espoir en devient le propriétaire.

Depuis son acquisition, l'Église a investi dans l'édifice en réaménageant les locaux, rénovant le stationnement, remplaçant la toiture et en mettant à jour divers éléments (climatisation, systèmes d'alarme et d'incendie, affichage et peinture à l'extérieur). Beaucoup de maintenance fut nécessaire. Aucun investissement majeur n'a été effectué, mis à part la toiture qui fut reconstruite par obligation.

RÉFLEXIONS ET OBJECTIFS RECHERCHÉS

La maison de Dieu dans une tente terrestre

L'Église est la maison de Dieu et si l'Église est l'assemblée des croyants, elle se réunit dans un édifice qui porte son nom. Le prophète Néhémie (chap. 13:11) réprimande son peuple d'avoir négligé la maison de l'Éternel.

Dans la vie, plusieurs s'identifient à leur chez soi, que ce soit une maison ou un logement. Pour les gens qui aiment leur quartier et qui veulent y rester, ils veulent aussi pouvoir le décorer et l'améliorer.

Il est naturel avec le temps de devoir rénover différentes pièces d'une maison, la salle de bain par exemple. Après un certain temps, la résidence vieillit, la famille grandit et les besoins changent. On renouvelle alors certains éléments afin de mieux répondre aux besoins actuels et futurs de la famille, pour le bien-être commun. On veut que les enfants se sentent écouter, qu'ils soient fiers d'amener des amis et que le nid familial soit accueillant.

Ce que nous voulons pour nos résidences, nous devons le transposer dans la maison du Seigneur pour notre famille spirituelle.

Investir dans la maison de Dieu

L'Église de l'Espoir est une assemblée multi-ethnique et multigénérationnelle, qui tend à être d'actualité. Que ce soit par la louange rythmée et contemporaine, les communications modernes ou par les décorations au goût du jour, l'Église veut s'intégrer intelligemment dans sa génération.

Malheureusement, le bâtiment et ses infrastructures ne représentent pas la personnalité de l'Église et semblent datés d'une autre époque, telle une salle de bain qui ne cadrerait pas avec le restant de la maisonnée. Nous voulons un lieu qui soit accueillant et plus fonctionnel. Pour ce faire, il ne faut pas laisser vieillir davantage l'édifice.

Il nous faut penser à long terme: où voulons-nous être dans 10 ans, dans 15 ans? Nous voulons pouvoir laisser en héritage un bâtiment en bonne condition aux plus jeunes générations. Nous voulons que chacun rêve et s'approprie la vision et le futur de l'Église. Après tout, c'est notre chez nous spirituel sur terre.

Voici les objectifs du Projet 911+

- S'orienter pour un autre 60 ans
- Répondre aux besoins actuels et futurs
- Avoir un endroit accueillant pour toutes les générations
- Mieux desservir l'Église et la Communauté
- S'éloigner du vieux format de centre d'achat pour être + communautaire
- Soutenir la vision

ANALYSE DE LA SITUATION

Le 911 Roland-Therrien : pour bien plus que ses membres

Pendant l'analyse de la situation, nous avons réalisé que le bâtiment dessert une grande quantité et diversité de gens, en plus de tous ceux fréquentant l'assemblée. Il faut dire que l'édifice possède une visibilité exceptionnelle, étant situé sur le boulevard Roland-Therrien, une artère importante.

Plusieurs centaines de personnes visitent les installations chaque année. Il y a tout d'abord les commerçants et les clients, notamment :

+ Les étudiants de l'école secondaire Jacques-Rousseau et ceux du Cégep Édouard-Montpetit
+ Les travailleurs de l'Union des Producteurs Agricoles (UPA)
+ Tous ceux qui louent la salle Edelma ou la grande salle

Les bureaux administratifs de l'Église reçoivent beaucoup de visiteurs de l'extérieur qui viennent pour des rendez-vous pastoraux ou même du counseling biblique.

Louer ses locaux est chose courante pour l'Église. De nombreux groupes bénéficient régulièrement des installations : la Coop Chrétienne École-Maison Rive-Sud, les retraités de Pratt & Whitney, l'École de musique Medad, le Centre Attitude et la garderie Sur les Pas de Bambi. Différentes locations sporadiques surviennent également ; des locaux sont en effet loués pour des mariages, des funérailles, des soirées de prières, des rencontres de JBEQ, SEMBEQ, l'AEBEQ, SOLA, Street Level, … Il y a également Bouffe pour Tous qui profite des locaux de façon hebdomadaire, ainsi que Prof Dino lors de sa distribution de cadeaux de Noël.

La communauté non-chrétienne profite également des locaux : que ce soit pour les élections canadiennes, des soirées-bénéfice ou des activités pour des organismes communautaires.

Programme Particulier d'Urbanisme du pôle Roland-Therrien (PPU)

Depuis quelques années, la ville de Longueuil a comme vision de développer plusieurs de ses quartiers. En 2013, elle a présenté un des volets de ses grands plans : construire un nouveau secteur et réaménager le pôle Roland-Therrien pour y favoriser un milieu de vie stimulant et agréable. La beauté de tout cela : le projet se situe juste aux pieds de l'Église.

Divers travaux en découleront : il y aura la décontamination et le réaménagement du coin Gentilly, et au printemps 2019, le début de la prévente des unités familiales. Il y aura une variété d'immeubles résidentiels et commerciaux qui auront une signature architecturale. Il devrait y avoir plus de 7 000 nouveaux logements.

Avec un tel quartier qui voit le jour, il serait intéressant et pertinent de s'inscrire de façon intelligente dans ce nouveau milieu de vie. Avoir un bâtiment plus moderne et mieux équipé serait certainement un atout pour rejoindre les gens.

L'Église de l'Espoir veut entrer dans le rêve de la ville de Longueuil en ce qui concerne son désir pour le quartier avoisinant. L'assemblée veut pouvoir être au service de la Communauté et de la ville, en plus d'y refléter la lumière de Christ. C'est une excellente occasion pour l'Église de réaliser sa vision à long terme. Nous voulons aller de l'avant de manière préparée et nous inscrire intelligemment dans ce projet.

PHASE 1

L'entièreté du Projet 911+ se veut réfléchi, modeste et humble. Il ne s'agit pas de construire le temple de Salomon, ni de se payer du luxe. Les dépenses ont été calculées avec minutie, toujours dans l'optique de bien investir ce que le Seigneur donne à l'Église. Les membres du comité ont voulu être de bons gestionnaires, intelligents et sages, mais aussi attentifs aux besoins du bâtiment. Il aurait été facile d'élaborer un projet coûtant 10 fois plus cher que celui présenté dans les pages suivantes. Plusieurs éléments considérés ont été rejetés car trop coûteux. Les trois éléments identifiés par le comité Priorités, c'est-à-dire le bloc sanitaire, les vestiaires et la grande salle, font l'objet de la démarche proposée : 3 phases en 3 ans. Le tout se veut simple et modéré, respectant les normes commerciales.

Avec ces rénovations et ces réaménagements, nous voulons accomplir + pour Jésus-Christ, l'Église, l'Évangile et la Communauté.

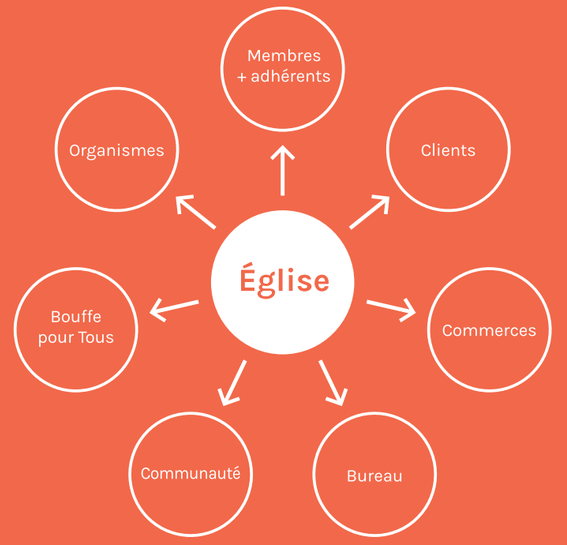

— Église de l'Espoir

PHASE 1

Le bloc sanitaire

Il faut tout d'abord mentionner que le bloc sanitaire publique demeure au même endroit, aucun changement ne s'opérera pour l'instant. Cependant, il est un peu loin de la grande salle, en particulier pour les personnes plus âgées dont l'Église veut prendre soin.

Le nouveau bloc sanitaire prendra la place du vestiaire du hall d'entrée, celui-ci étant réaménagé ailleurs comme vous pouvez le voir à la page suivante, selon les suggestions de l'architecte. Cela permettra de mieux respecter tous ceux et celles qui louent ou utilisent la grande salle, en plus de répondre à un besoin. De plus, l'endroit choisi facilite énormément le travail de plomberie.

Le nouveau bloc sanitaire pour hommes comportera 2 toilettes, 2 urinoirs et 2 lavabos. Celui des femmes disposera de 7 toilettes et 4 lavabos. Le tout serait situé près de la grande salle et du vestiaire, à l'usage exclusif des gens de l'assemblée.

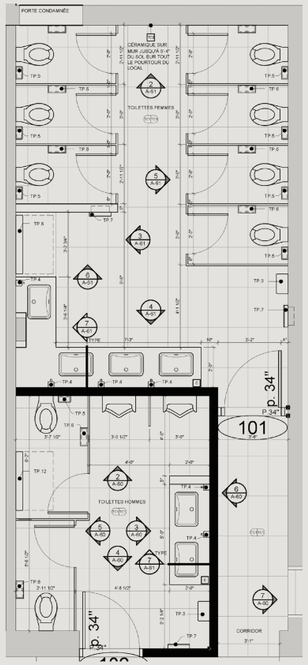

Le vestiaire

Le nouveau vestiaire réunira les deux vestiaires actuels. Il débutera dans le hall d'entrée et se prolongera jusqu'à la cage d'escalier menant à la Zone explo. Plusieurs ministères sont touchés par ce changement, mais des réaménagements ont été envisagés et sont expliqués plus en détail à la page suivante. Une porte non apparente donnant accès à la grande salle sera présente, principalement à l'usage de BPT.

La fusion des deux vestiaires vise 3 objectifs :

1 **Créer un espace unique**

Celui-ci deviendrait ainsi un lieu social, permettant les rencontres et favorisant les échanges.

2 **Augmenter la capacité du vestiaire pour la croissance ou les événements**

Présentement, les deux vestiaires sont très occupés. L'espace actuel peut contenir 160 manteaux. Avec les rénovations, la capacité passerait à 400. L'installation de 100 crochets à deux niveaux, pour les manteaux longs et courts, et l'ajout de plusieurs bancs pour enfants sont prévus.

3 **Éliminer la circulation dans la grande salle**

Celle-ci peut être dérangeante pour certains, par exemple lors du cours le dimanche matin à 9h. Le vestiaire donne un accès direct à la Zone explo, cuisine et arrière-scène permettant à ceux de la grande salle de se concentrer et d'être ressourcés sans mouvement environnants. Le nouveau vestiaire a l'avantage d'être situé tout près du bloc sanitaire et des portes d'entrée.



RÉAMÉNAGEMENTS & BÉNÉFICES

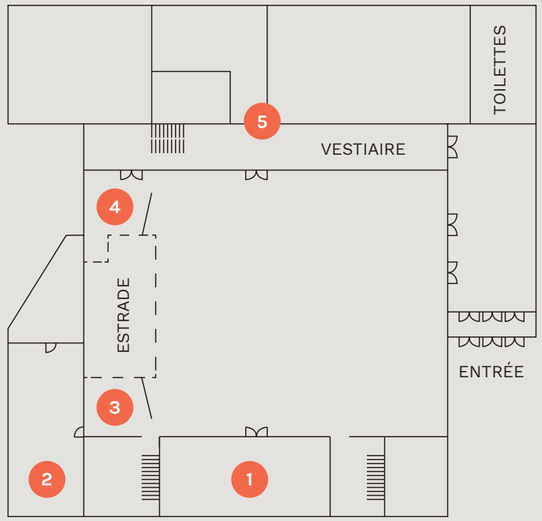

Réaménagement

La bibliothèque et la salle de conférence seront déplacées dans le local actuel Jeunesse-Boomerang. L'espace disponible passera ainsi de 500 pi.2 à 850 pi.2. Cette nouvelle pièce aura également une vocation de salle de prière, de conférence et de formation, utile pour les cours de formation SEMBEQ.

Le local derrière l'estrade deviendra bifonctionnel. Il sera aménagé pour accueillir la Jeunesse et les équipes de louanges. Le groupe d'adolescents gagne ainsi environ 120 pi.2, soit 14% de plus que leur ancienne localisation. L'arrangement et la décoration de la salle restent à déterminer. Le comité Design veut impliquer les jeunes et les membres des équipes de louanges dans le processus. Le but souhaité est d'obtenir un espace convivial, chaleureux et agréable, de style lounge.

Le local Déco, présentement situé en arrière de l'estrade, sera déménagé derrière un des murs adjacents à celle-ci. Plusieurs étagères et un espace de rangement suffisant y seront aménagés. Le local Entrepôt, qui est actuellement à côté de la cuisine, sera déplacé derrière l'autre mur adjacent à l'estrade.

Pour ce qui est de l'entrée de Bouffe pour Tous, elle sera réaménagée.

Bénéfices

+ Faire construire un nouveau bloc sanitaire permet d'en avoir suffisamment et à proximité
+ Avoir un seul vestiaire facilite les échanges, en plus de créer une atmosphère plus chaleureuse et d'avoir les gens tous réunis au moment endroit. Aussi, un tel vestiaire élimine la circulation et la distraction dans la grande salle
+ Les deux nouvelles infrastructures, c'est-à-dire le bloc sanitaire et le vestiaire, rendent possible une croissance en nombre des membres, en plus de nous permettre de mieux accueillir les gens
+ Le tout représentera davantage la personnalité de notre Église et de notre assemblée

Légende

1. Bibliothèque
   Salle de formation
2. Jeunesse Boomerang
3. Déco
4. Entrepôt
5. Entrée
   Bouffe pour Tous

PHASE 2

Objectif grande salle, changements & bénéfices

Les réaménagements et rénovations de la grande salle ont pour but de rendre cet espace plus chaleureux et plus fonctionnel, et de s'éloigner du style « centre d'achat des années 80 ». L'ensemble des changements permettra d'avoir un environnement qui représente mieux l'image contemporaine et dynamique de l'Église. Tous les choix effectués sont déterminants pour l'avancement de la vision.

Le but est d'obtenir une pièce qui soit conviviale, attrayante et pratique pour différents événements et à usages multifonctionnels. Plusieurs changements vont donc se produire dans la grande salle.

Électricité et éclairage

Une mise à jour des installations électriques est requise afin de respecter les normes du Code du Bâtiment en vigueur. Le panneau électrique, présentement situé dans la colonne centrale, sera déplacé. L'éclairage actuel datant d'une autre époque et ne permettant aucun contrôle sur l'intensité de l'éclairage sera remplacé par des luminaires Dell qui viennent avec des gradateurs. Ces derniers rendent possible un contrôle de l'intensité lumineuse.

Plafond

L'ensemble du plafond suspendu disparaîtra, incluant les fils électriques et autres fils. Après cette opération, il faudra remplacer chacun des éléments enlevés. La totalité des infrastructures sera peinte en noire : poutres, poutrelles, ventilation, tuyaux, gicleurs, etc.

Des îlots de tuiles acoustiques de couleur noire seront posés au plafond. Il y aura 10 îlots de 8 pi x 28 pi et un grand de 6 pi x 60 pi. Une ligne de bois suspendu au plafond complètera le tout.

La colonne centrale sera enfin retirée, changeant ainsi l'allure de la salle entière. Un ingénieur en structure de bâtiment a été consulté et a confirmé que cela est possible à un prix raisonnable.

Il y aura également des changements quant aux murs, au couvre-plancher et à la porte d'entrée, ainsi que le retrait du vestiaire-famille. Les améliorations seront nombreuses.

Bénéfices

+ Le système électrique répondra alors aux normes du Code du Bâtiment
+ Le nouvel éclairage permettra de créer l'atmosphère désirée selon l'événement
+ Il y aura dorénavant une allée centrale et une meilleure visibilité pour l'ensemble de la pièce
+ La grande salle sera plus attrayante et plus fonctionnelle pour mieux servir à la Communauté chrétienne et aux organismes communautaires de la ville
+ L'aménagement sera plus actuel et plus esthétique

— Église de l'Espoir

PHASE 3

AUTRES SECTIONS TRAVAILLÉES ET BÉNÉFICES

Dans la troisième phase, plusieurs changements divers auront lieu, selon l'échéancier et les fonds disponibles. Voici la liste des améliorations souhaitées :

+ De nouvelles chaises pour la grande salle
+ Le hall d'entrée (plancher, murs, plafond, éclairage et insonorisation)
+ De nouvelles portes à l'extérieur de la grande salle, comme celles du vestiaire
+ Le corridor du centre commercial (plancher et éclairage)
+ Le bloc sanitaire public
+ De nouvelles portes extérieures pour les 3 entrées du centre commercial (dans le but qu'elles possèdent un bouton électrique pour ceux et celles à mobilité réduite)
+ L'administration, counseling
+ La Zone explo
+ Bouffe pour Tous, cuisine et autres ministères

Bénéfices

+ L'Église aura ainsi un hall d'entrée mieux insonorisé et qui l'identifiera davantage
+ Le nouveau bloc sanitaire public sera plus respectueux de nos locataires commerciaux et de leurs clientèles
+ Les portes extérieures seront plus sécuritaires et mieux isolées
+ L'Église améliorera les installations des différents ministères
+ L'ensemble des rénovations et réaménagements représenteront mieux la personnalité de l'Église, en plus d'être aux goûts du jour

Nous voulons améliorer le bâtiment, et accomplir davantage la vision de l'Église.

FINANCEMENT & BUDGET

Au cours des dernières années, les membres ont été généreux et les finances de l'Église ont été gérées avec sagesse. Le budget d'opération a été respecté et nous avons même eu des surplus en 2017 et 2018. Notre situation financière est donc très positive et stable. À ce jour, tous les espaces commerciaux sont loués, incluant les logements.

Les membres de l'assemblée ont toujours été très généreux, autant par leurs dons monétaires, spirituels, que dans leur degré d'engagement. En 2015, lorsque l'objectif « + 20% pour la vision » fut lancé, les gens ont donné généreusement et ce fut un succès. Nous avons confiance que l'assemblée sera fidèle et permettra l'accomplissement de ce projet.

L'Église de l'Espoir a énormément de potentiel avec ses infrastructures, ses communications et ses membres. Ensemble, par le Projet 911+ nous voulons accomplir plus pour Jésus-Christ, l'Église, l'Évangile et la Communauté. Voici le budget sommaire pour Projet 911+. Pour tous les travaux effectués, il s'agit d'un excellent prix!

Avec 600 000$, nous réaliserons tous les réaménagements et rénovations mentionnés dans les pages précédentes.

PHASE	DÉTAILS	$
Phase 1	+ Plans design et architecturaux + Bloc sanitaire + Vestiaire + Réaménagement	*200 000*
Phase 2	+ Plafond + Enlèvement de la colonne centrale + Couvre-sol + Mur intérieur de l'entrée et nouvelles portes d'accès à la grande salle	*200 000*
Phase 3	+ Chaises + Hall d'entrée (couvre-sol céramique, murs, plafond, éclairage, insonorisation) + Corridor (couvre-sol céramique, murs, plafond, éclairage) + Toilettes publiques actuelles + Nouvelles portes d'entrée extérieures + Administration, jungle, BPT, extérieur, etc.	*200 000*
		Total : 600 000 $

(Incluant une contingence min. 10% ; montant de 57 545$)

Suite Financement p. 14 →

PROJET 911+

Formulaire de contributions volontaires
- Paiement unique

PRÉNOM _____ **NOM** _____

Par la foi, après réflexions et prières, je m'engage à contribuer au financement de la Phase #2 du Projet 911+ par

un montant de _____ **$ qui sera remis d'ici le** _____ **(date).**

_____
SIGNATURE ET DATE

Pour ce faire, deux options s'offrent à vous :
(1) indiquer Projet 911+ sur votre enveloppe de dons
(2) donner en ligne en sélectionnant Projet 911+

Prière de déposer ce formulaire d'engagement dans le sac d'offrandes d'ici la fin juin 2019

Église de l'Espoir
Psaume 911

Financement

En ce moment, l'Église est en mesure d'entamer la Phase #1. Le premier 200 000$ proviendra d'un emprunt.

Ceci ajoutera des mensualités d'environ 1 300$ pendant 20 ans que nous serons en mesure de respecter.

PHASE	DÉTAILS	$
Phase 1	Emprunt	*200 000*
Phase 2	Dons 60e anniversaire	*60 000*
	Dons	*100 000*
	Autres	*40 000*
Phase 3	Selon options disponibles	*200 000*
		Total : *600 000 $*

(Il n'y aura aucun emprunt sans l'approbation des membres)

Pour les deux phases suivantes, nous avons confiance que Dieu fera de grandes choses, qu'il réalisera son plan en déposant dans le cœur de ses membres ce projet. A nous de demander à Dieu d'être témoins de la réalisation de son plan.

Donc nous prions que le financement de la Phase #2 se concrétise grâce à la générosité des membres de l'Église de l'Espoir à partir de dons sacrificiels. Notre rêve est d'avoir ramassé 60 000$ pour la soirée du 60e anniversaire de l'Église, et le reste dans les mois suivants. Tous ces dons spécifiques au Projet 911+ seront déductibles d'impôt.

Pour la Phase #3, il y aura différentes options qui seront envisagées selon la capacité financière de l'Église et les opportunités que le Seigneur pourvoira. Nous aimerions vous assurer que l'Église n'ira chercher aucun emprunt sans l'approbation des membres au moyen d'un vote à cet effet.

Il faut avancer sans crainte et avec foi. Nous prions, rêvons et espérons que le tout soit fait d'ici 3 ans. Amen!

PROJET 911+

Formulaire de contributions volontaires
- Paiements périodiques

PRÉNOM _____ **NOM** _____

Par la foi, après réflexions et prières, je désire donner pour la Phase #2 en procédant au moyen de montants périodiques.

Je souhaite verser un montant mensuel de _____ $ pour une durée de _____ mois, débutant le _____ (date).

_____

SIGNATURE ET DATE

Pour ce faire, je procéderai selon une des trois options suivantes :

- ◯ Par mon enveloppe de dons en indiquant Projet 911+
- ◯ Par mes dons en ligne en sélectionnant Projet 911+
- ◯ Par des prélèvements bancaires préautorisés

Note : vous serez alors contactés pour remplir un formulaire bancaire spécifique.

Prière de déposer ce formulaire d'engagement dans le sac d'offrandes d'ici la fin juin 2019

Église de l'Espoir
Psaume 911

ÉCHÉANCIER & MOT DE LA FIN

Échéanciers

PHASE 1 Début été 2019

PHASE 2 Objectif été 2020

PHASE 3 Objectif 2021

Suite à un appel de soumissions, les travaux de rénovations seront exécutés par un entrepreneur chrétien fidèle.

Cet entrepreneur a fait des rénovations majeures au sein de quelques Églises de notre Association, ainsi qu'aux locaux de SEMBEQ.

En raison des règlements sur les projets de construction accomplis par des bénévoles, plusieurs travaux devront être effectués par des travailleurs qualifiés. Cependant, de nombreux travaux pourront être effectués par des bénévoles de l'Église avant l'arrivée de l'entrepreneur, que ce soit les réaménagements, les déménagements ou une partie de la démolition.

Chers frères et sœurs, nous avons besoin de votre aide.

Priez pour l'accomplissement du Projet 911+, priez pour l'œuvre que Dieu fera à chaque étape, priez pour l'œuvre qu'Il accomplit à Longueuil. Nous voulons être une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ, au service de la Communauté.

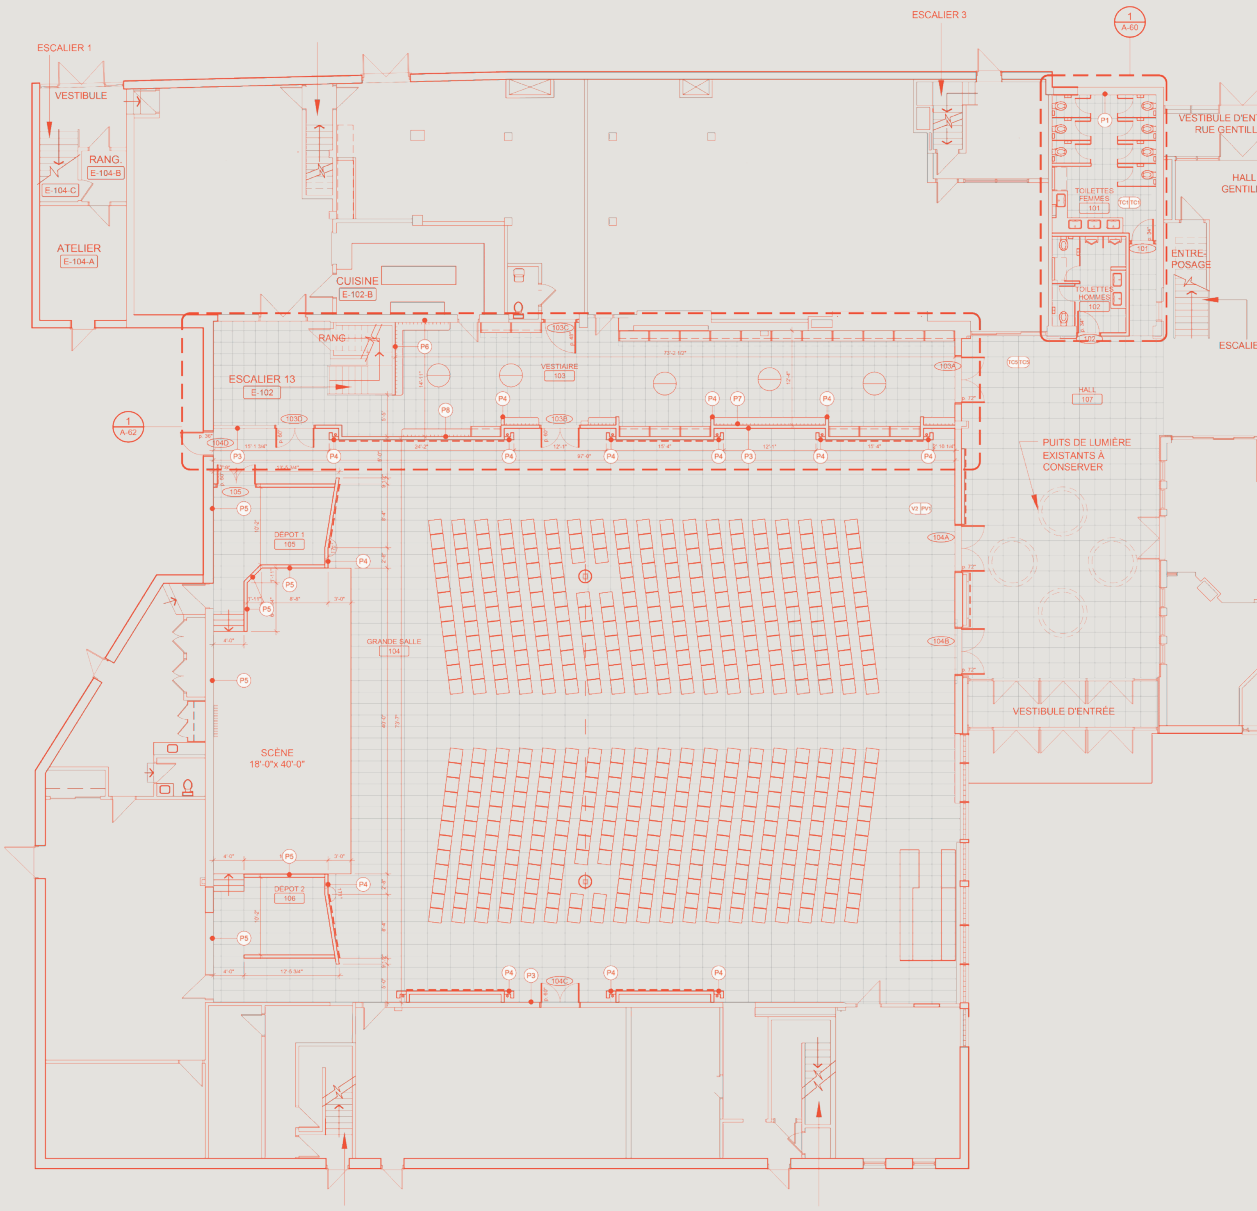

Psaumes 9.11

« C’est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi, car toi, jamais tu ne délaisses, Ô Éternel, celui qui se tourne vers toi »
